

Gemeinde Mühlenbecker Land



Informationsvorlage

Vorlage Nr.: IV/0045/19

Information vom Bürgermeister

Zuständigkeit: FB II / FD Finanzverwaltung

eingereicht am: 12.08.2019

FBL I
FBL II

.....
Bürgermeister

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	öff.	nöff.	Vertreter		Abstimmungsergebnis				Beschlussempfehlung	
				gew.	anw.	ja	nein	enth.	*ausg.		
2	Gemeindevertretung	02.09.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23						
1	Hauptausschuss	20.08.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9						<input type="checkbox"/>

Wortlaut:

Zwischenbericht zum Haushalt 2019

Anlagen:

Haushaltsbericht 2019



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2019


Haushaltsbericht

Im folgenden Bericht wird der Haushaltsvollzug des Jahres 2019 mit dem Stichtag 12. August 2019 dargestellt.

Im Bereich der Erträge wurde ein Erreichungsgrad von 77 % erzielt. Steuern und Zinsen stellen dabei den größten Teil dar. Bei den Kostenerstattungen und -umlagen wurden bisher nur 17 % erreicht. Das liegt daran, dass die Abrechnungen zum Beispiel für den Kostenausgleich gemäß Kitagesetz größtenteils noch nicht erfolgt ist.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in € per 12.08.2018	Differenz in €	prozentualer Erreichungsgrad
	2019	2019	2019	
Steuern und ähnliche Abgaben	12.233.000,00	10.260.213,79	1.972.786,21	83,87%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287.812,91	9.358.698,13	2.929.114,78	76,16%
Sonstige Transfererträge	2.000,00	0	2.000,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.200,00	708.204,72	652.995,28	52,03%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.403,85	199.758,19	272.645,66	42,29%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.600,00	29.286,91	142.313,09	17,07%
Sonstige ordentliche Erträge	573.600,00	311.454,34	262.145,66	54,30%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.500,00	47.620,84	9.879,16	82,82%
Summe ordentliche Erträge	27.159.116,76	20.915.236,92	6.243.879,84	77,01%


Erträge 2019

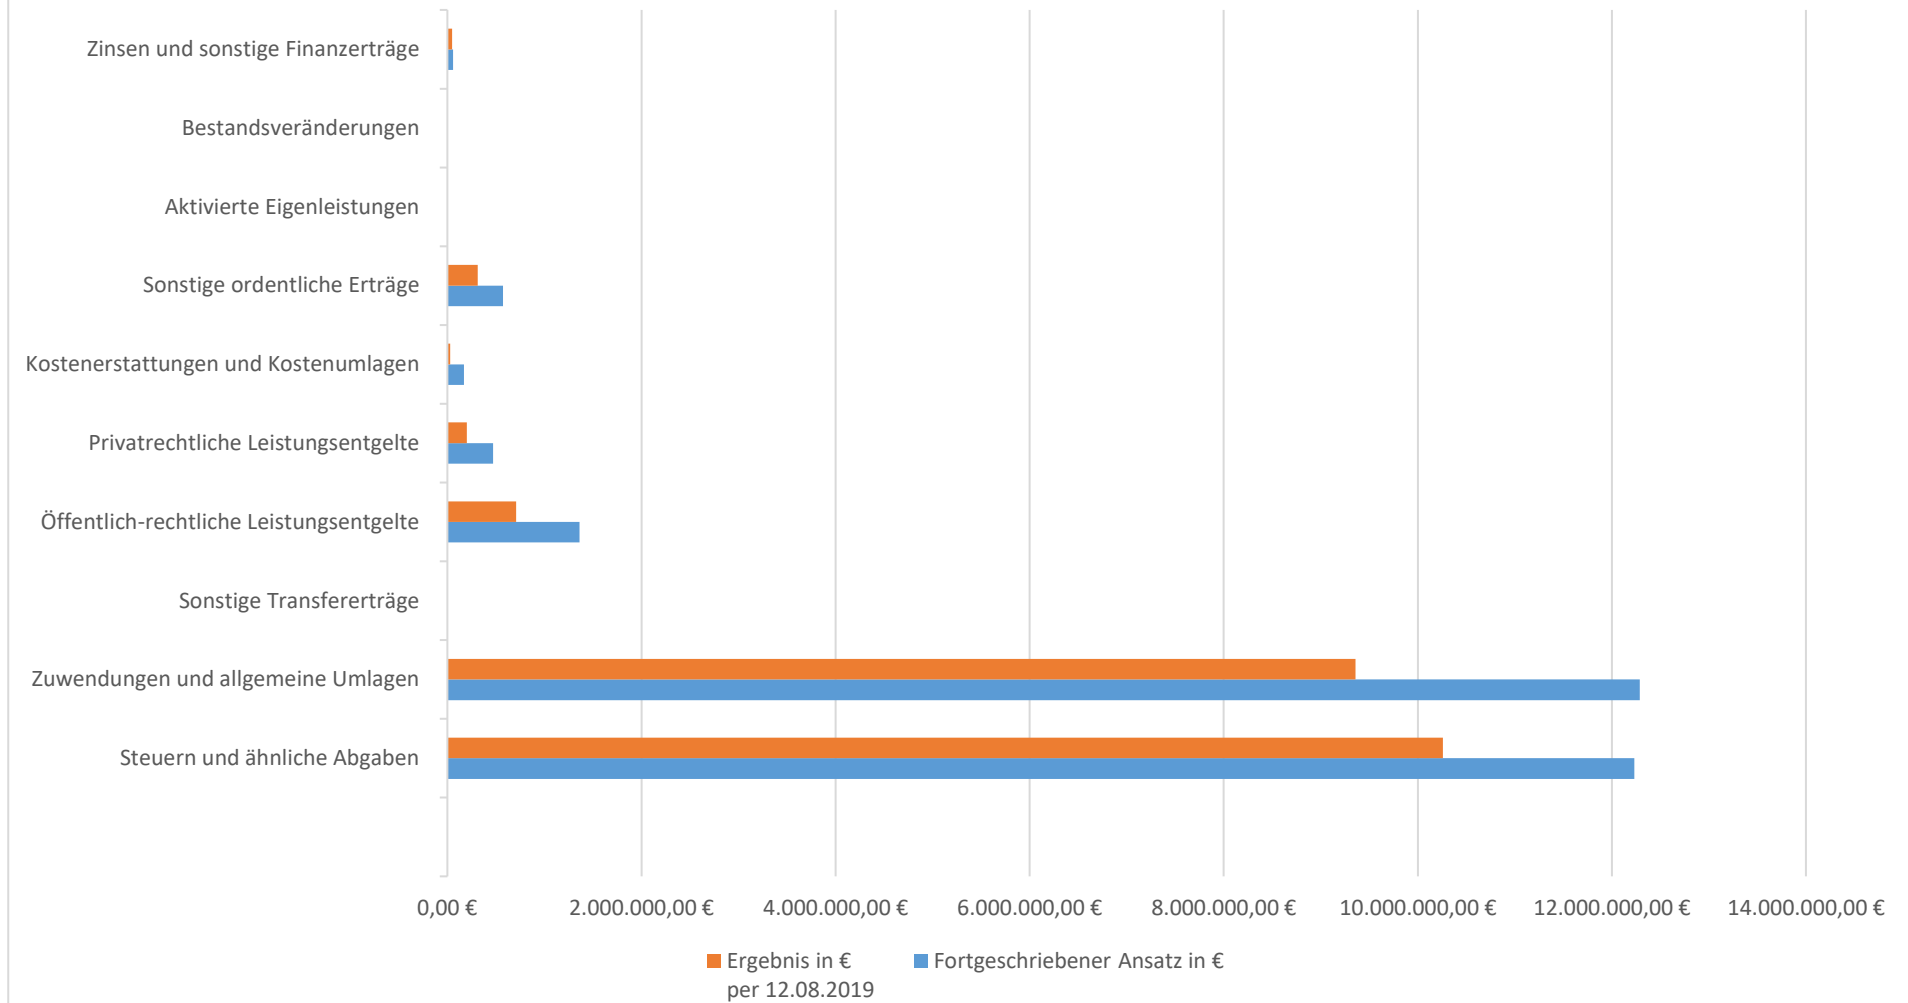

Im Bereich der Aufwendungen wurden mit Stand vom 12.08.2019 54,81 % der geplanten Mittel in Anspruch genommen. Vor allem bei den Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen ist der Erreichungsgrad gering. Das liegt daran, dass diese Konten erst zum Jahresabschluss 2019 belastet werden. Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen für Abschreibungen und Versorgungsaufwendungen werden im Jahresabschlussbericht der Gemeinde Mühlenbecker Land dargestellt.

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in € per 10.08.2018	Differenz in €	prozentualer Erreichungsgrad
	2019	2019	2019	
Personalaufwendungen	8.441.900,00	4.657.446,52	3.784.453,48	55,17%
Versorgungsaufwendungen	-35.800,00	0,00	-35.800,00	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583.814,44	2.333.603,74	3.250.210,70	41,79%
Abschreibungen	2.738.800,00	130.367,18	2.608.432,82	4,76%
Transferaufwendungen	10.076.498,84	7.433.599,17	2.642.899,67	73,77%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.783,05	2.054.496,98	1.466.286,07	58,35%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.000,00	36.836,62	10.163,38	78,38%
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>30.372.996,33</u>	<u>16.646.350,21</u>	<u>13.726.646,12</u>	<u>54,81%</u>


Aufwendungen 2019

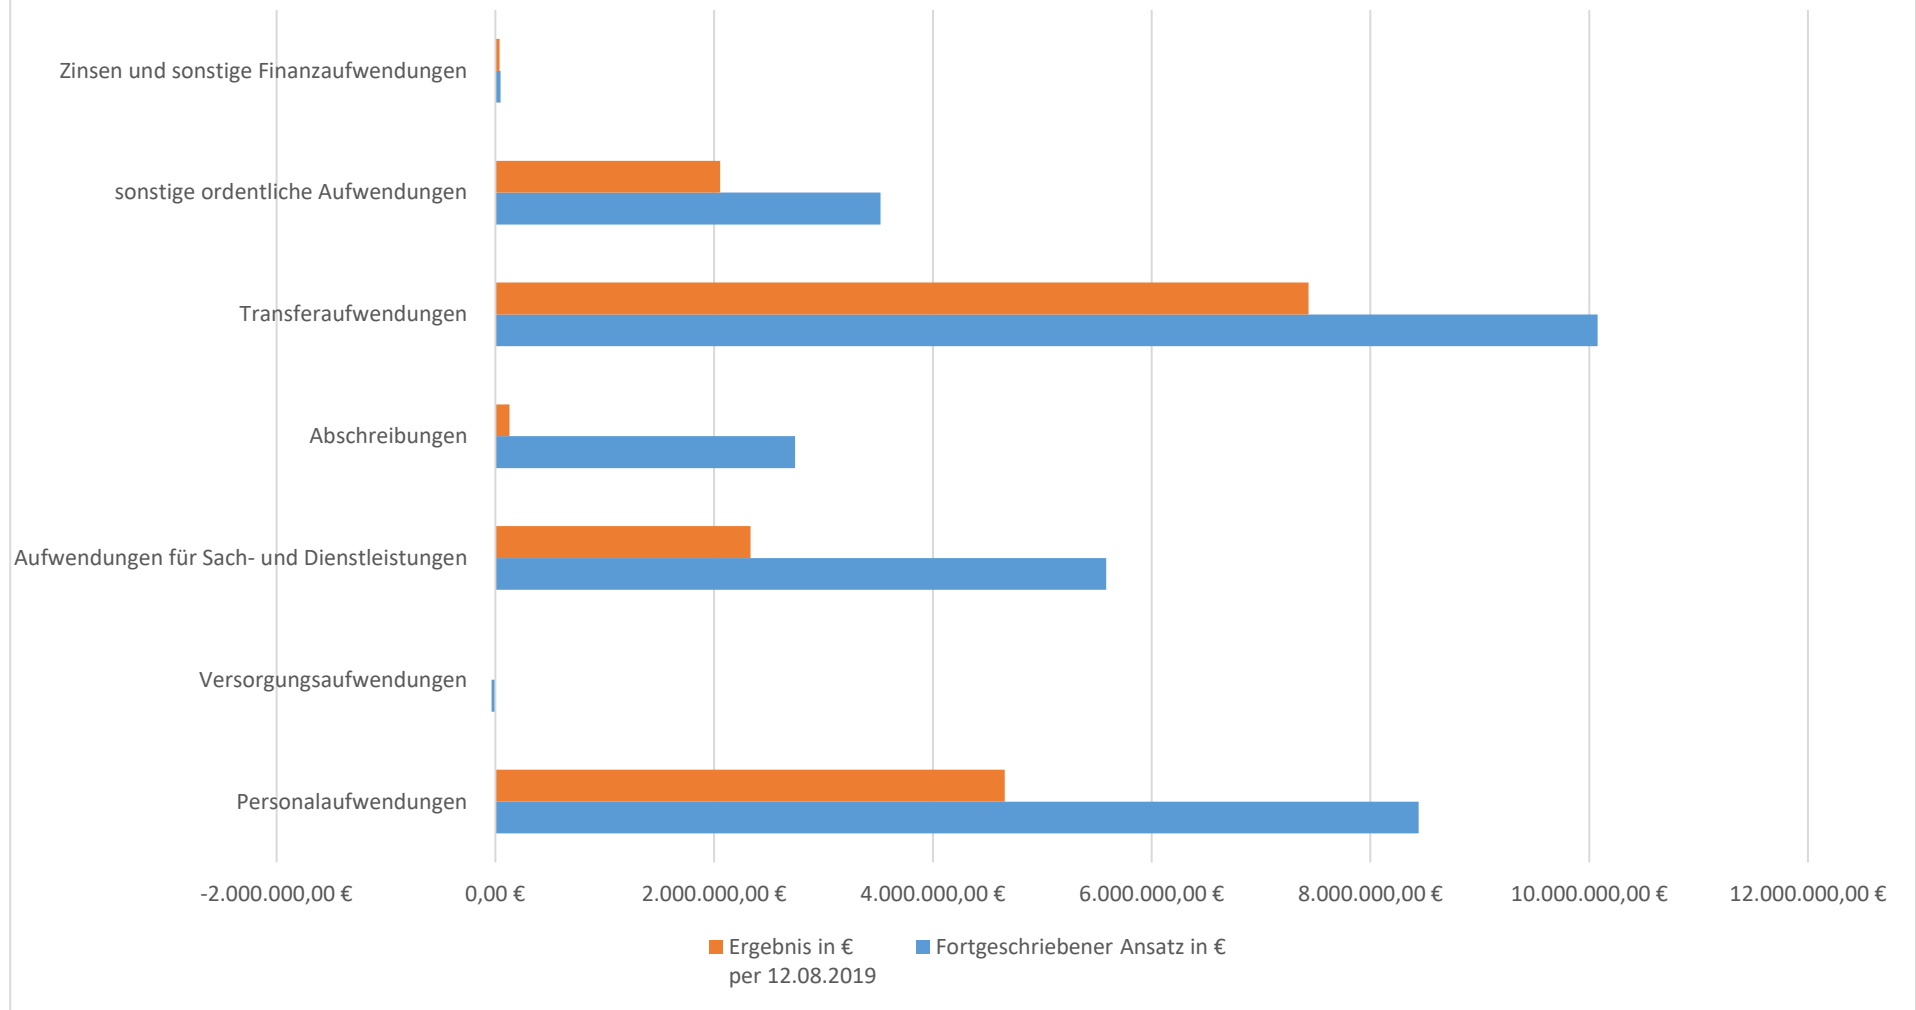

Auf den folgenden Seiten werden die Investitionen der Gemeinde Mühlenbecker Land und deren Bearbeitungsstand im aktuellen Haushaltsjahr dargestellt. Weiterhin gibt es Informationen über umgesetzte Projekte der baulichen Unterhaltung.

Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111009009901	217.710,05 €	94.295,49 €	123.414,56 €

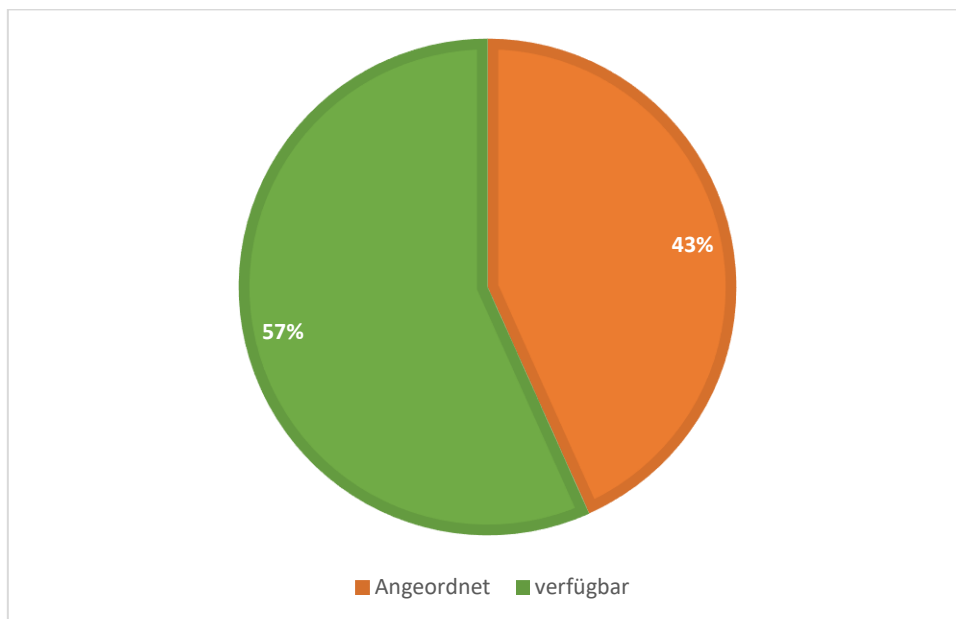


Die Einführung eines elektronischen Anordnungsworkflows, also einer papierlosen Rechnungsbearbeitung, wurde erfolgreich umgesetzt. Seit dem 01.04.2019 werden alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen ausschließlich digital verarbeitet.

Weiterhin wurden für die Verwaltung Mobiliar und PC-Technik angeschafft. Für das Bürgerbüro ist eine neue Küche geplant.

Erweiterungsbau Rathaus


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111001201901	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €

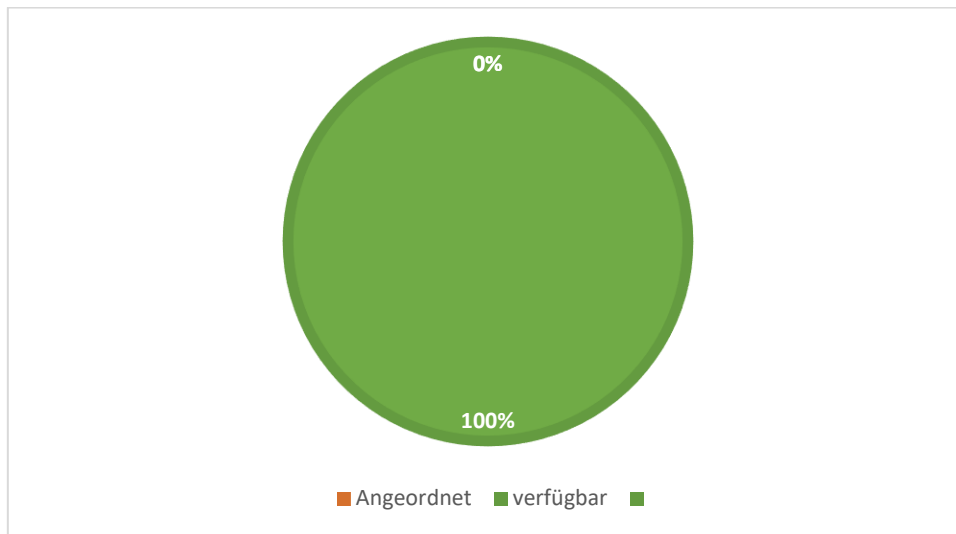

Für den Erweiterungsbau wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Nun soll eine konkrete Planung erstellt werden. Dafür werden Angebote eingeholt. Für eine Auftragsvergabe muss ein Beschluss durch die Gemeindevertretung erfolgen. 2020 werden weitere Planungskosten benötigt.

Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111209009901	74.974,78	60.397,40	14.577,38 €

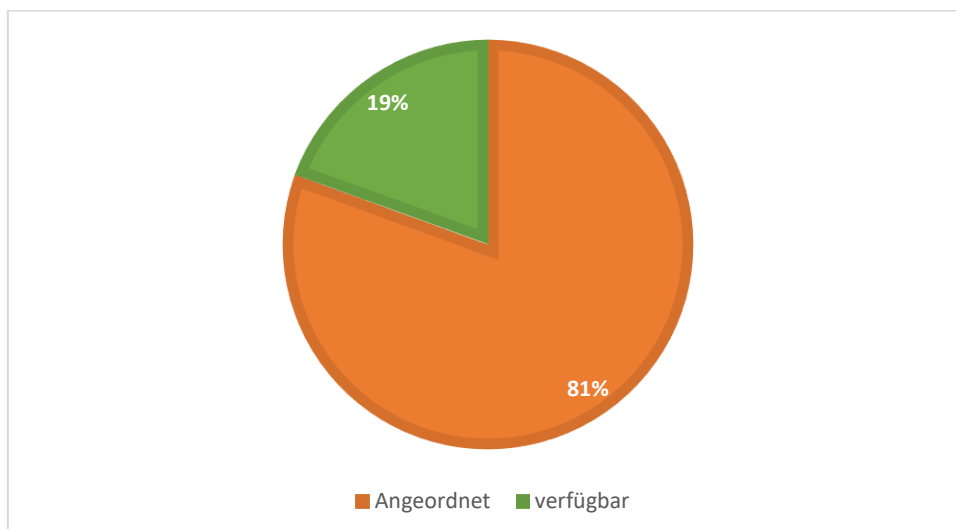

Die Mittel wurden für Trinkwasseranschlüsse und Teilberäumungen von Pachtgrundstücken und den Ankauf eines Grundstückes in Großstückenfeld verwendet. Weiterhin wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt.

investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen/sozial verträglicher Wohnungsbau


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
111309009902	1.486.726,68	699.206,58	787.520,10 €

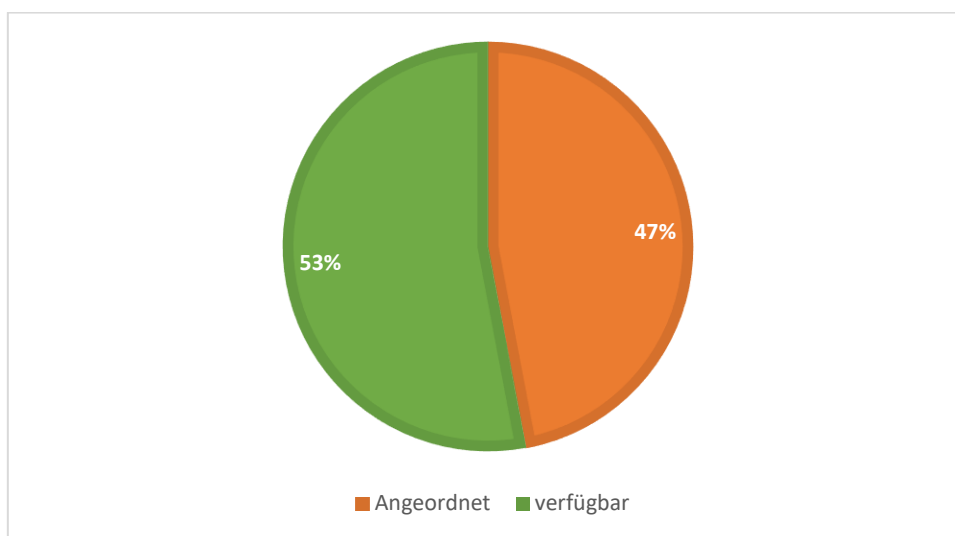

Das erste Wohnhaus ist fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt soll von 2019 bis 2021 andauern. Nächste Schritte sind der Abriss des alten Gebäudes und die Stellung des Bauantrages.

Investitionen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
122009009901	13.800,00 €	0,00 €	13.800,00 €

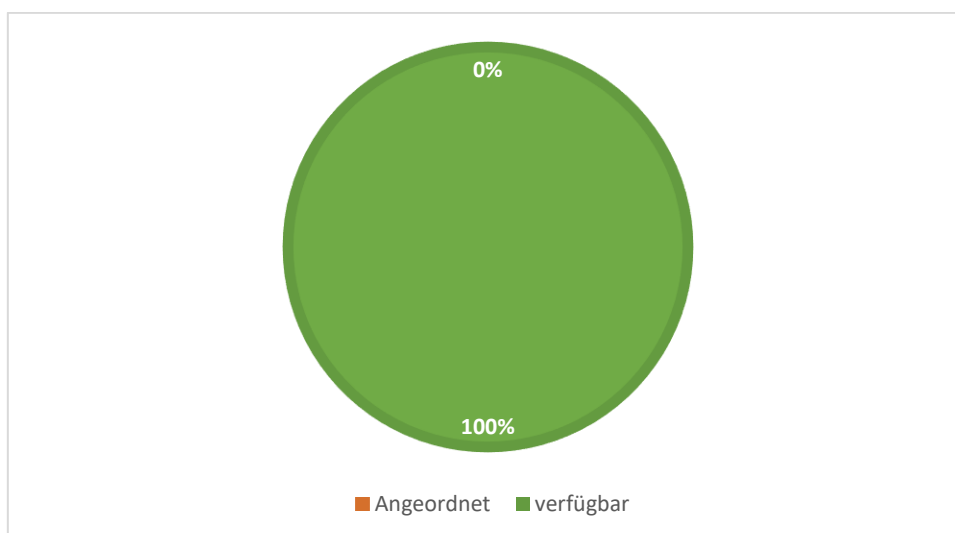

Es ist vorgesehen, von den eingestellten Mitteln Hundetoiletten im Gemeindegebiet aufzustellen.

Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren aller Ortsteile


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
126009009901	101.396,04	64.625,61	36.770,43 €

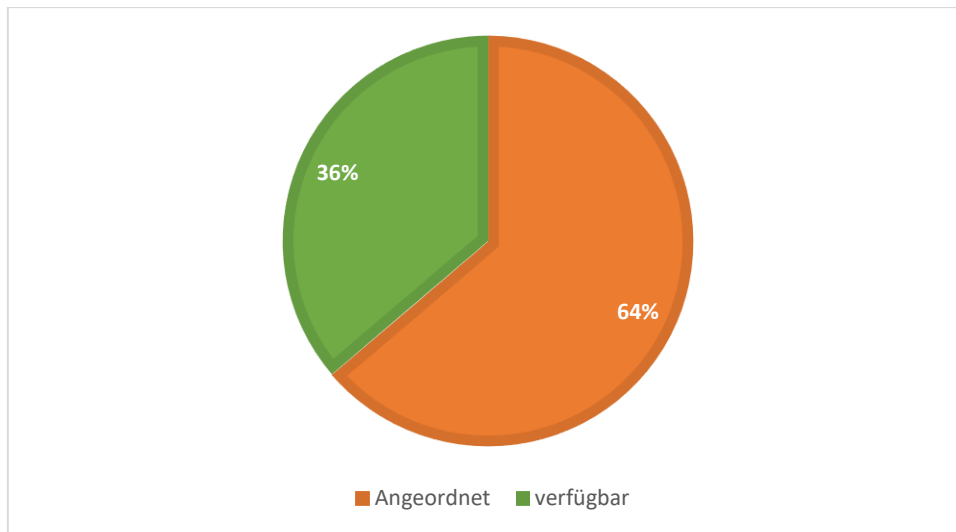

Für die Feuerwehren wurden Arbeits- und Rettungsmaterialien, wie Spreizer, Schlauchmaterial, Schneidgerät, Tragkraftspritze, Kompressor und Bolzenschneider beschafft.

Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
126002201901	20.000,00 €	4.152,62 €	15.847,38 €

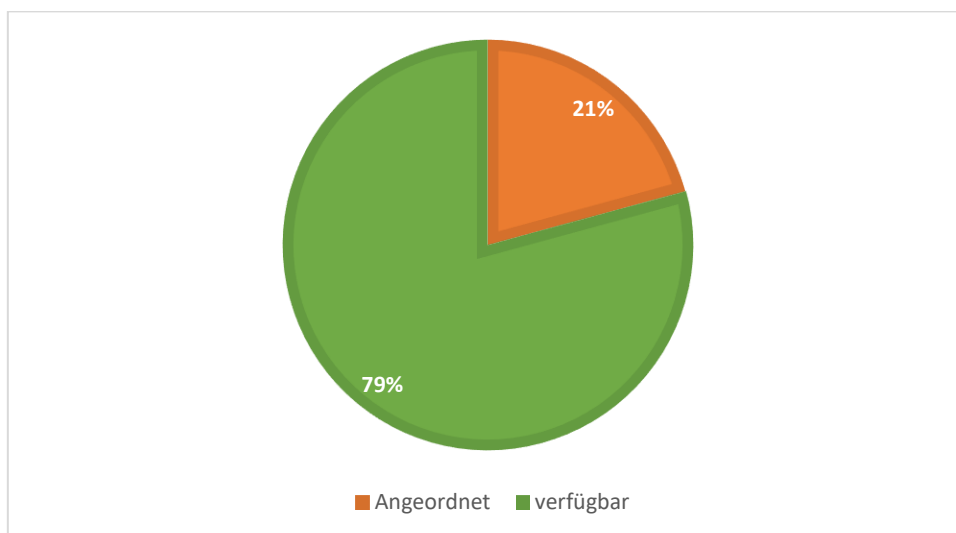

Es soll ein Lösch- und Notwasserbrunnen im OT Schildow gebaut werden. Eine Erkundungsbohrung wurde bereits in Auftrag gegeben.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
126009009902	460.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €

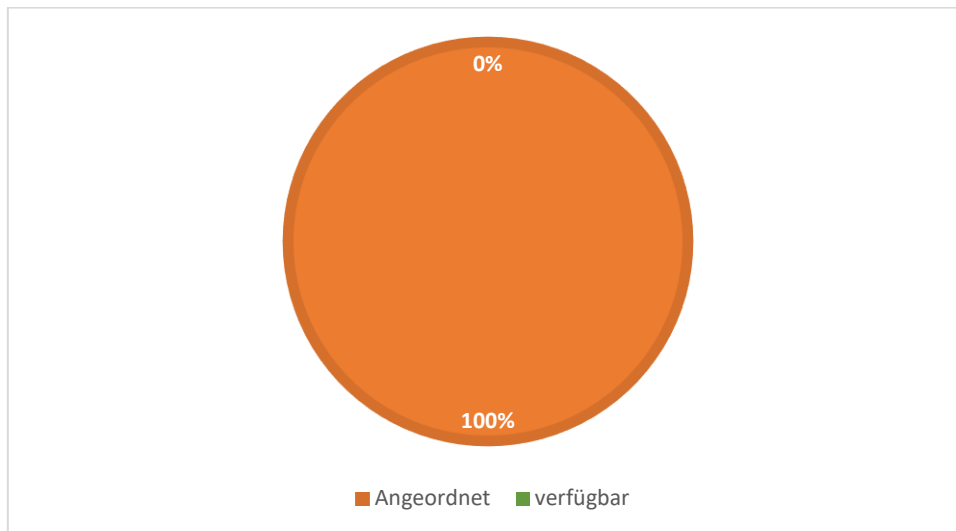

Die Bestellung für das Fahrzeug wurde ausgelöst. Die Lieferzeit beträgt 24 Monate und erfolgt im Juni 2021.

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in der Käthe-Kollwitz-Schule in Mühlenbeck


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211111009901	68.304,94 €	43.951,26 €	24.353,68 €

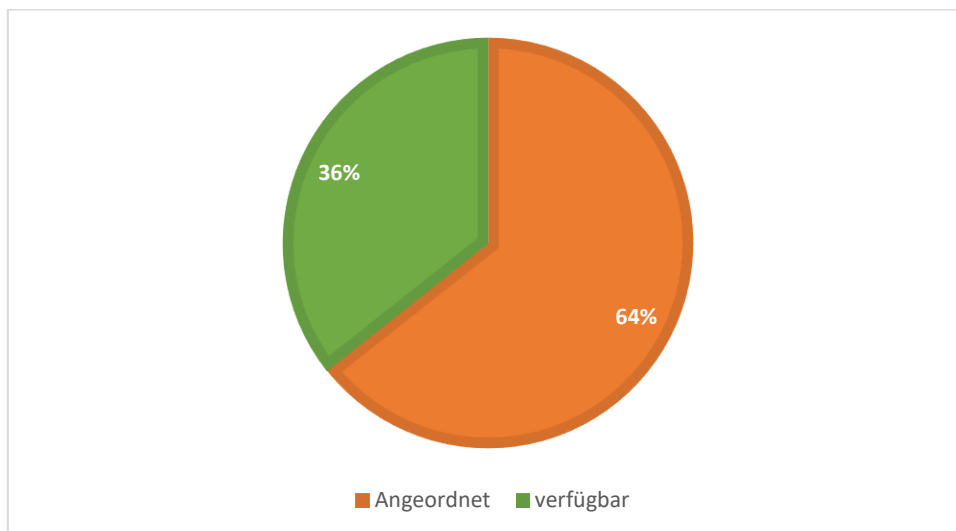

Für die Schule in Mühlenbeck wurde ein Drucker beschafft. Für 2019 ist noch der Kauf von Schränken und Activeboards geplant. Mittel dafür wurden bereits gebunden.

Ballfangzaun Sportplatz/Zaun Schulgarten


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211111201801	20.000,00 €	17.888,63 €	2.111,37 €

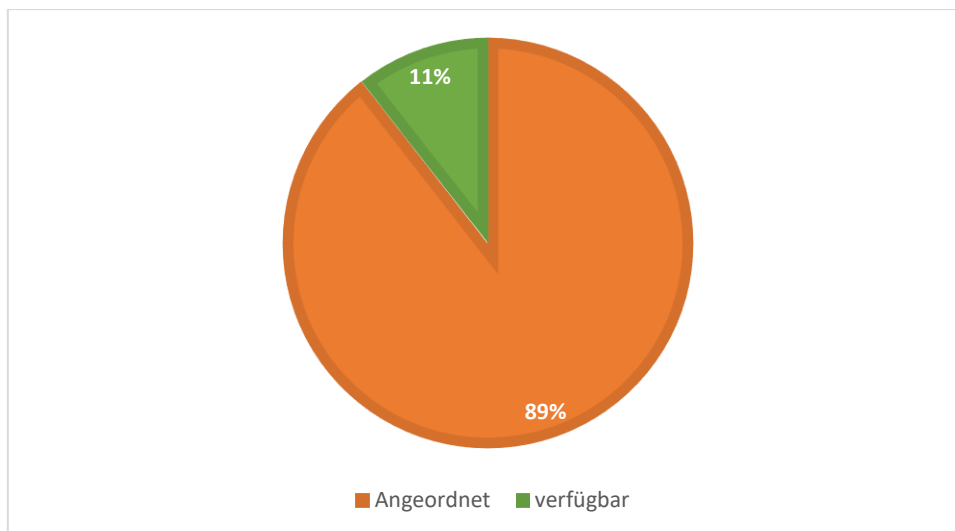

Der Ballfangzaun wurde aufgestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211111201901	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €

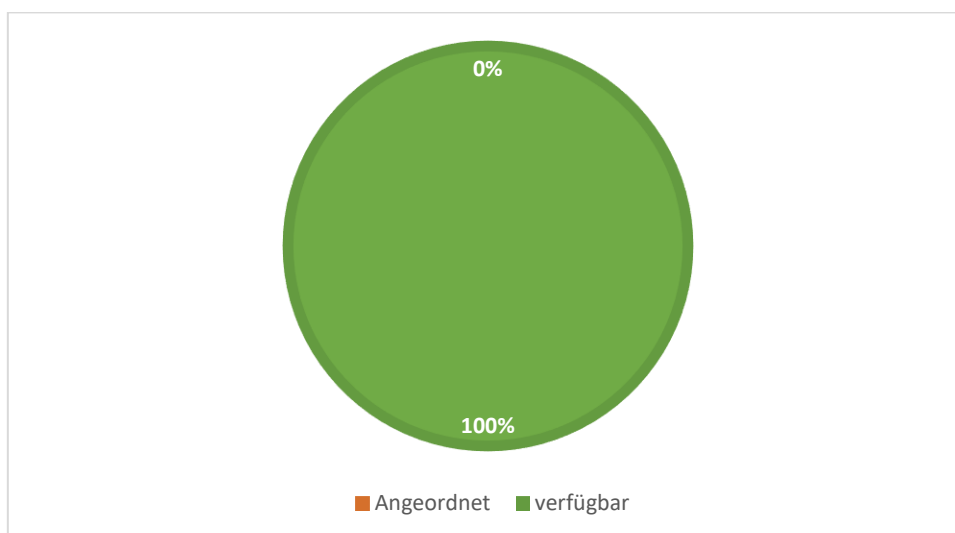

Es ist eine Erweiterung im Bereich der Sporthalle angedacht. Gemeinsam mit der Schulleitung wird ein Entwurf erarbeitet, der dann durch einen Planer umgesetzt werden soll.

Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in der Europaschule in Schildow

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
211212009901	116.500,00 €	101.669,95 €	14.830,05 €

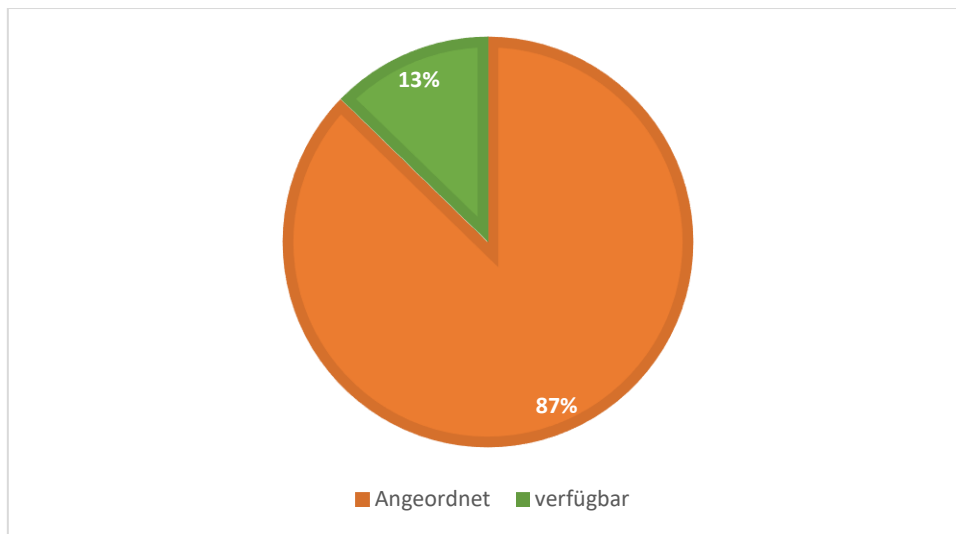


Für die Europaschule wurde ein neuer Kühlschrank angeschafft. Weitere Mittel wurden für Ausstattungsgegenstände für den Sportunterricht und die Toiletten- und Waschräume, sowie Beamer und Activeboards eingeplant.

Für das Förderprogramm „Medienfit“ wurden 69.000 € gebunden. Der Bewilligungsbescheid für die Fördermittel wurde erteilt. Die Ausschreibung für Umsetzung des Projektes läuft. Die Umsetzung soll bis 31.12.2019 erfolgen.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Raupe Nimmersatt“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365111009901	58.772,22 €	22.181,14 €	36.591,08 €

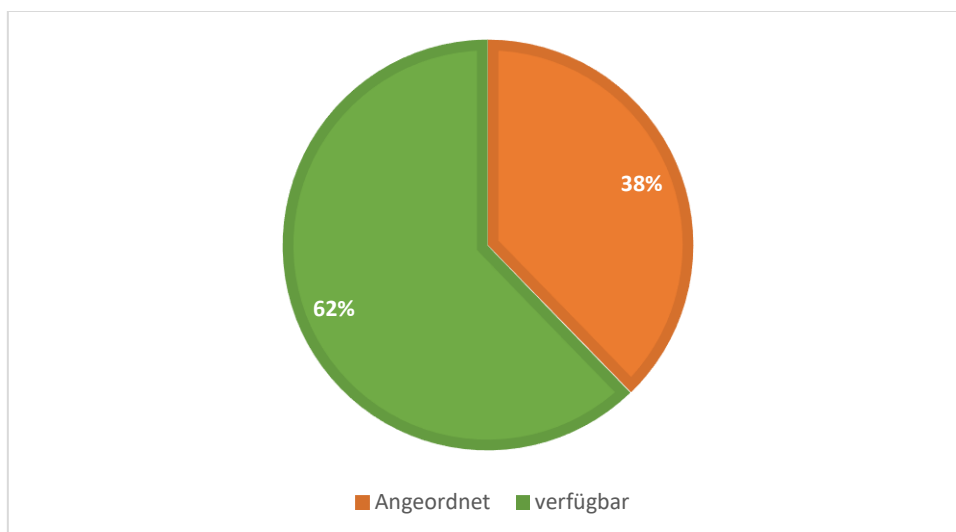

Die Kita wurde mit Mobiliar, einem Forscherschrank, einer Sitzgruppe und einer Malwand für den Außenbereich ausgestattet. Es sollen weitere Außenspielgeräte angeschafft werden.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Koboldhaus“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365121009901	22.193,00 €	7.261,00 €	14.932,00 €

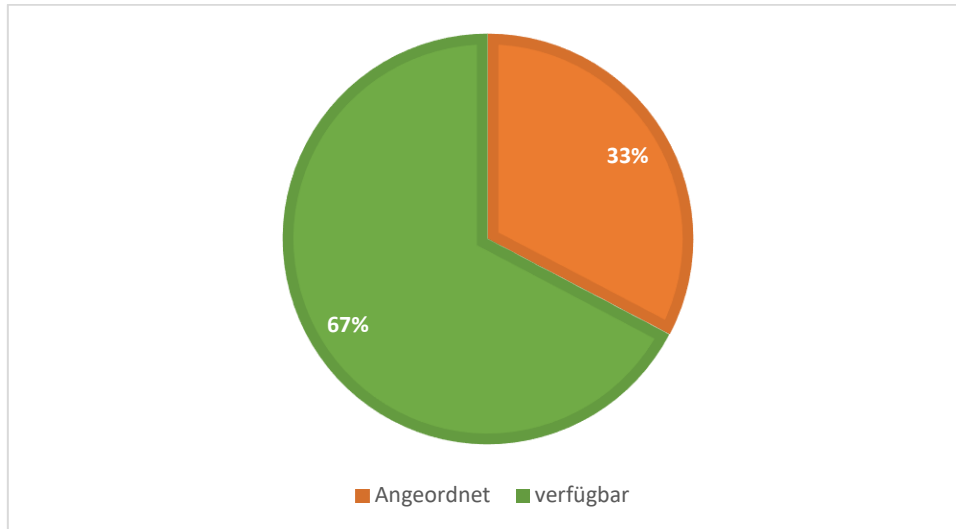

Für die Kita wurden Holzspielzeuge, Matten, Teppiche und ein Krippenwagen beschafft. Die Erweiterung der Außenspielgeräte und ein Tipi sind noch vorgesehen.

Maßnahmen zur Gestaltung des Außenbereichs in der Kindertagesstätte „Koboldhaus“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365121009902	86.738,80 €	11.455,41 €	75.283,39 €

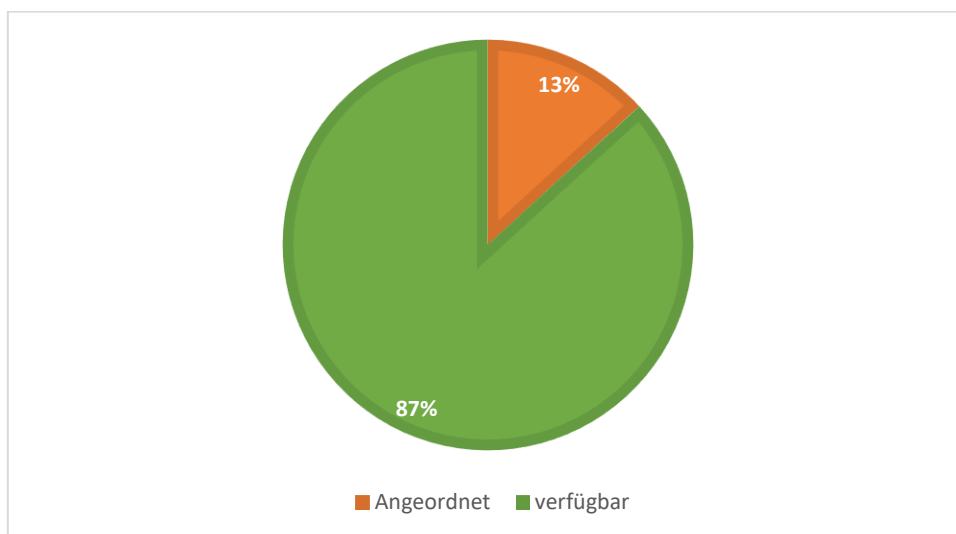

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Bauphase soll noch in diesem Jahr beginnen.

**Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung im Hort
„Mühlenbecker Land Kids“**


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365131009901	9.000,00 €	5.012,29 €	3.987,71 €

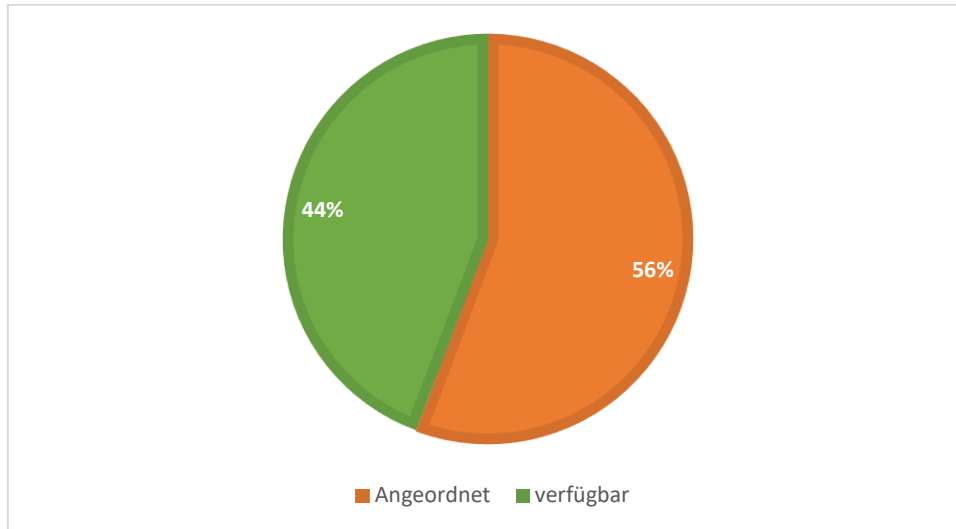

Der Hort wurde mit einem Heimkinosystem und Teppichen ausgestattet. Geplant ist der Kauf einer Blechgarage.

**Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte
„Spatzenhaus“**


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365212009901	8.600,00 €	5.969,98 €	2.630,02 €

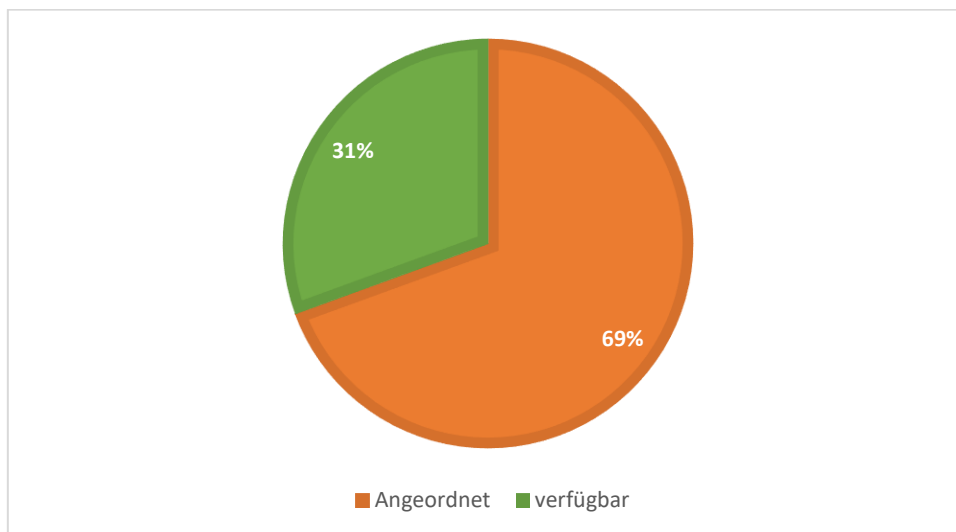

Der Krippenbereich wurde mit einer Sitzgruppe ausgestattet. Ein Notebook und Liegepolsterschränke wurde ebenfalls angeschafft.

**Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte
„An der Heidekrautbahn“**


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365222009901	7.000,00 €	2.050,00 €	4.950,00 €

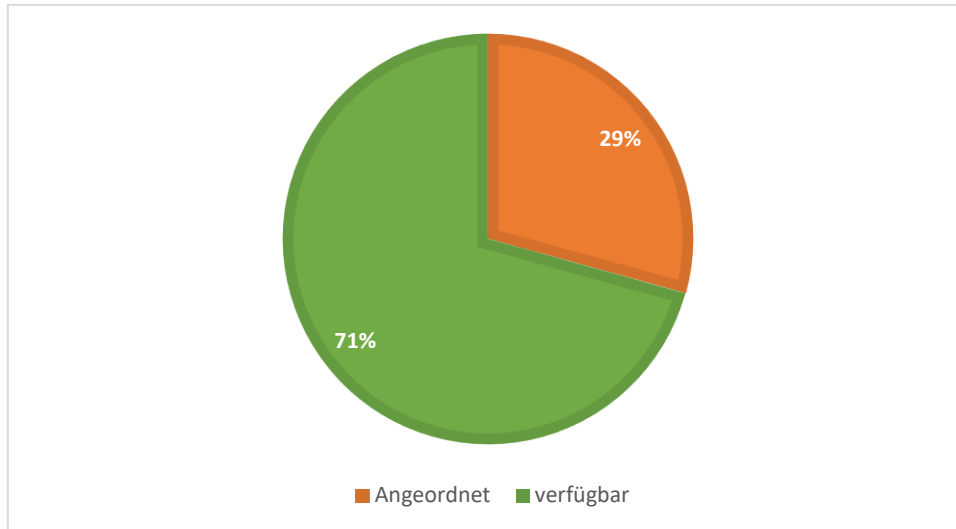

Es wurden bereits Mittel für Fahrzeuge und einen Verkleidungswagen gebunden. Weitere große Investitionen sind nicht vorgesehen, da eine Gesamtausstattung im Zuge des Neubaus erfolgte.

Ersatzneubau Kindertagesstätte „An der Heidekrautbahn“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365222201401	1.777.378,39 €	1.676.943,09 €	100.435,30 €

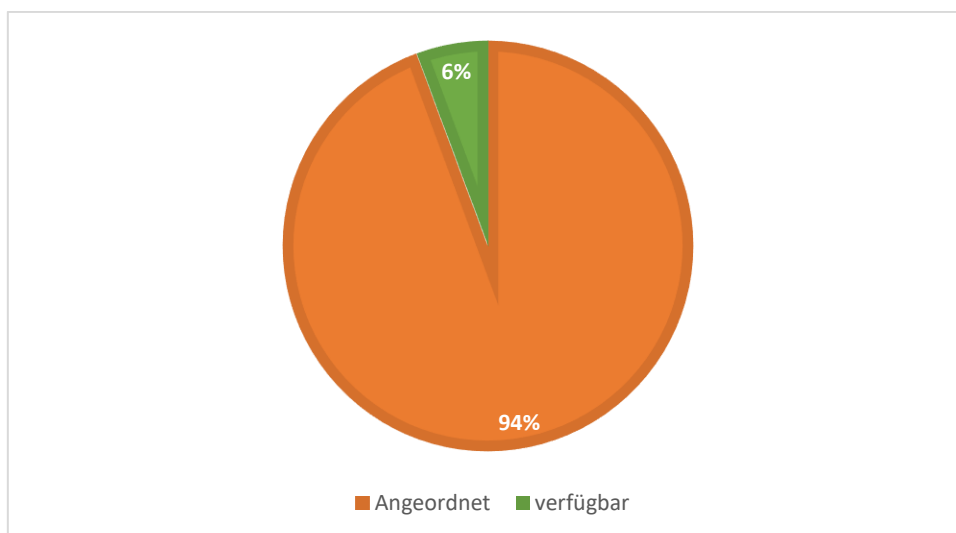

Im April 2019 wurde der Neubau in Betrieb genommen. Der Außenbereich ist nahezu fertiggestellt. Der Abriss des Altbaus ist erfolgt. An dieser Stelle entstehen Parkmöglichkeiten.

**Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung im Hort
„Kinderland“**


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365232009901	48.321,88 €	6.760,28 €	41.561,60 €

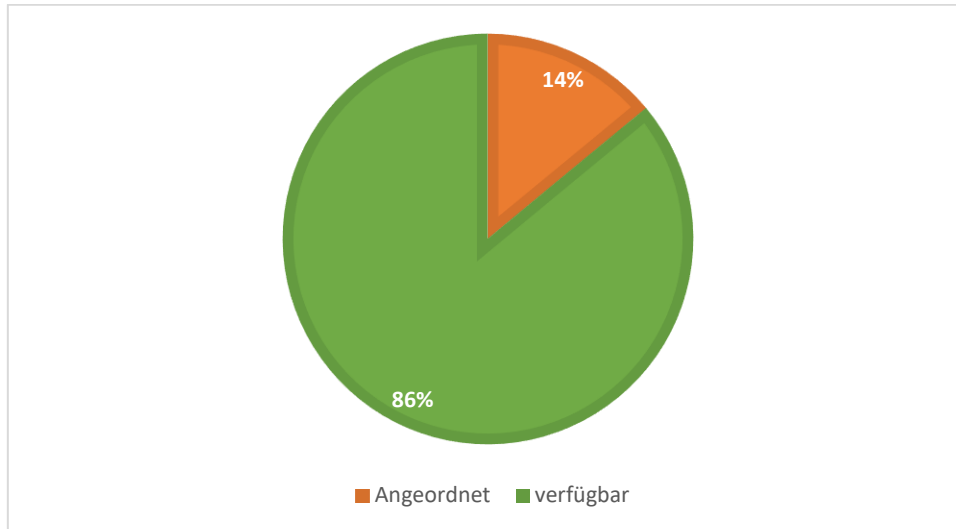

Der Hort wurde mit einem Bühnenpodest ausgestattet. Die geplanten Mittel für den Außenbereich werden vorerst zurückgestellt, da dieser im Zuge des Neubaus in die Planung mit einbezogen wird.

Erweiterungsbau für den Hort „Kinderland“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365232201701	234.190,24 €	148.141,32 €	86.048,92 €

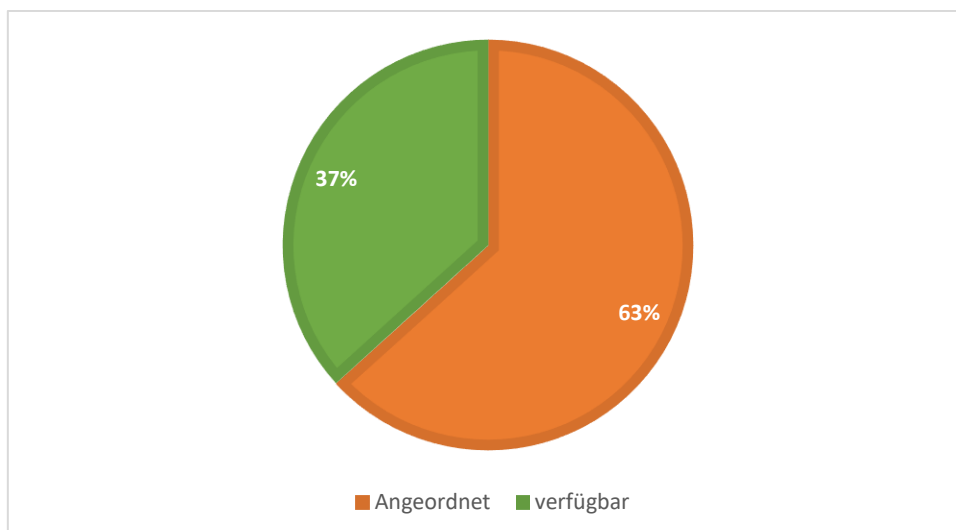

Gemeinsam mit der Hort-Leitung wurde der Entwurf überarbeitet. Der Neubau soll mit dem Altbau verbunden werden, daher müssen auch im bestehenden Gebäude einige Arbeiten durchgeführt werden. Der endgültige Entwurf wird der Gemeindevertretung vorgelegt und durch diese beschlossen. Anschließend wird der Bauantrag gestellt.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Kita am Schlosspark“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365313009901	61.283,19 €	23.916,85 €	37.366,34 €

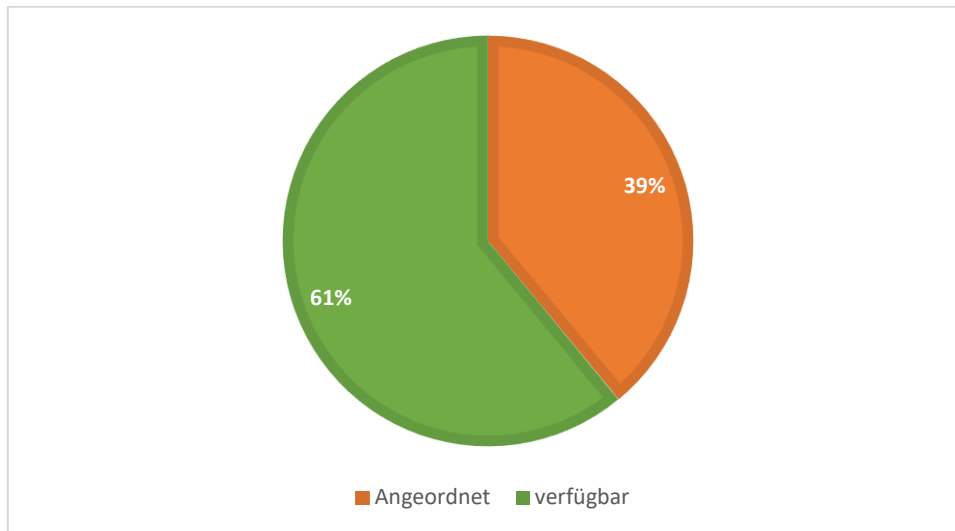

Für die Kita wurden Krippenbettchen, Fahrzeuge und ein Schaukasten angeschafft. Eine Fertiggarage soll noch beschafft und die Etagenrutsche ausgetauscht werden.

Einbau neuer Fettabscheider in der Kindertagesstätte „Kita am Schlosspark“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365313201401	75.000,00 €	57.578,19 €	17.421,81 €

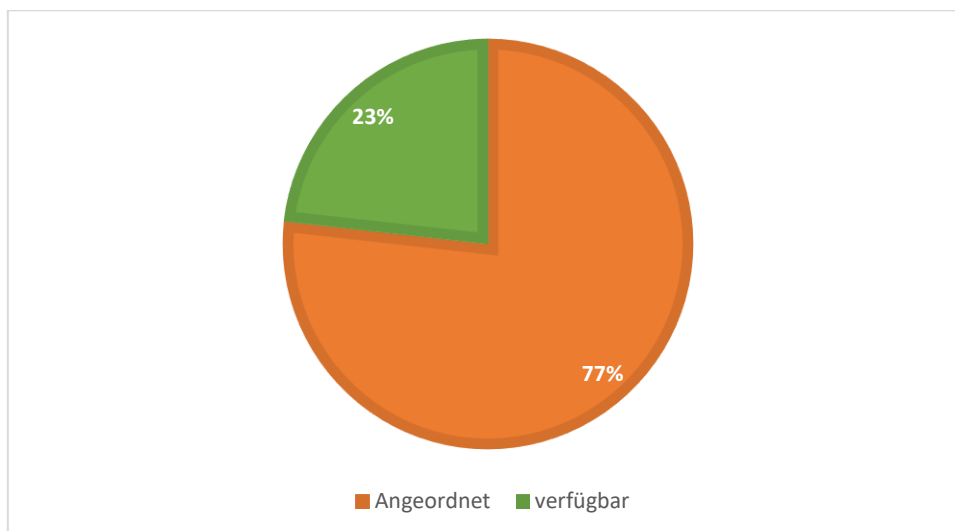

Der Einbau des Fettabscheiders ist erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte „Schneckenhaus“


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
365414009901	26.030,28 €	25.867,04 €	163,24 €

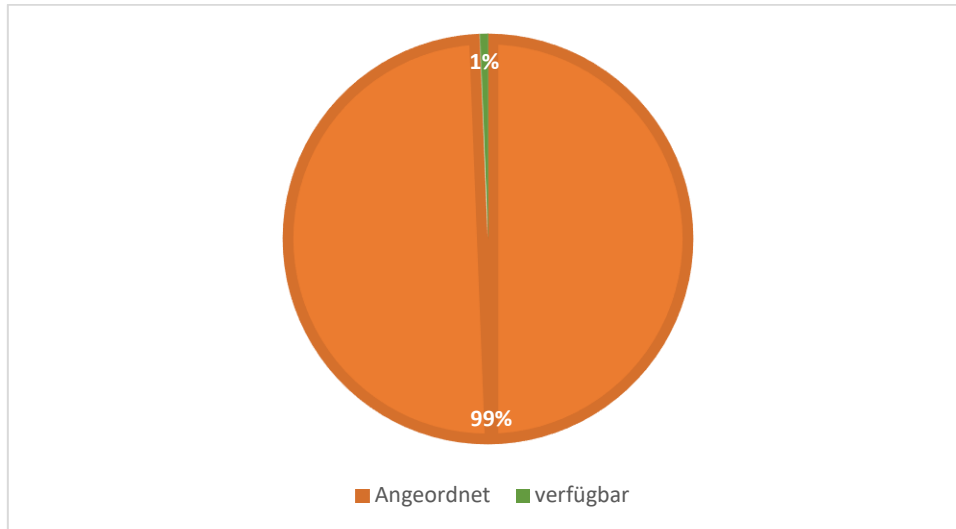

Es wurden diverse Ausstattungsgegenstände, wie Spiegel, Garderobenwagen und eine Kuschelecke angeschafft. Ein Tipi, Spielgeräte nach Hengstenberg und Spiel- und Schlafpodeste wurden bereits bestellt.

Neubau Jugendclub Mühlenbeck


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
366001201901	15.000,00 €	4.500,00 €	10.500,00 €

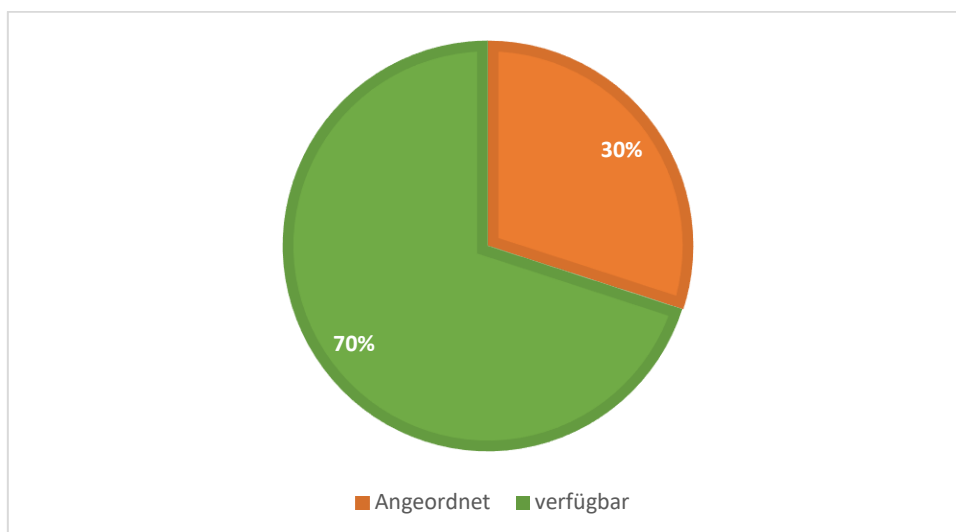

Derzeit befindet sich das Projekt in der Vorplanung. Die Machbarkeit wird untersucht.

Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541002201701	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €

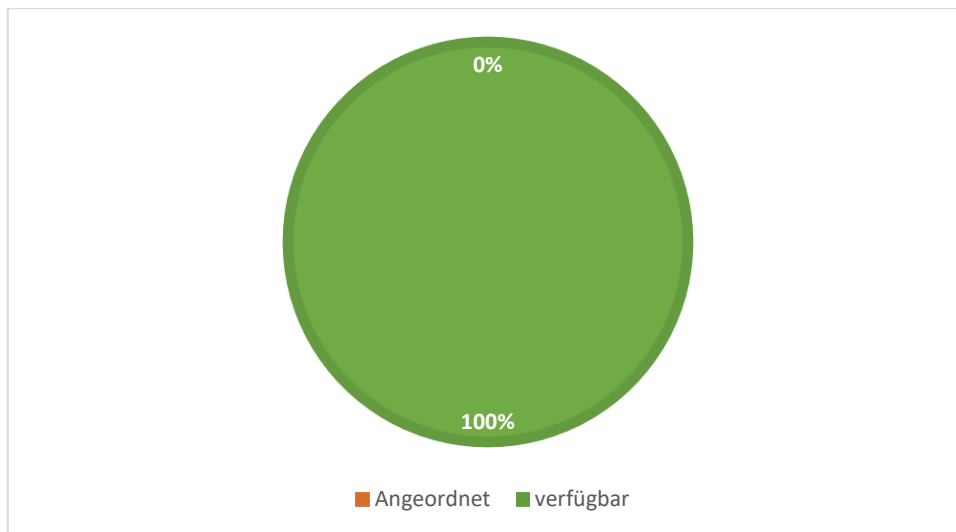

Der Planungsauftrag geht in die Beschlussfassung durch die Gremien. Der weitere Ablauf des Projektes ist jedoch vom Bau des Seniorenheimes abhängig.

Straßenbau Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541002201802	1.946.815,62 €	17.210,79 €	1.929.604,83 €



Die Planung für den Straßenbau liegt vor, wurde aber nicht durch die Gemeindevertretung beschlossen. Es liegen mehrere Petitionen gegen diesen Straßenbau vor.

Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenheim


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541002201803	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €

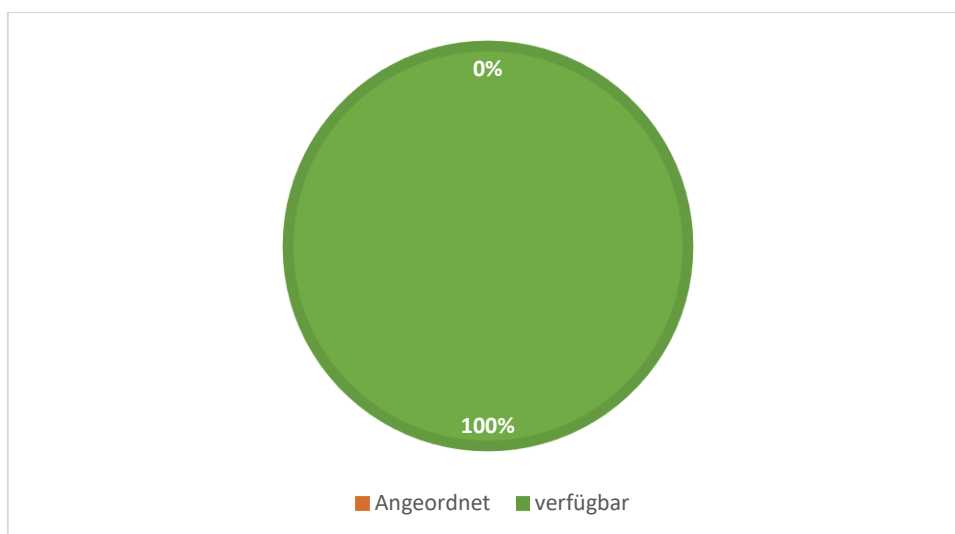

Der weitere Verlauf dieses Projektes hängt vom Bau des Seniorenheimes ab.

Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541004201601	8.300,00 €	7.140,00 €	1.160,00 €

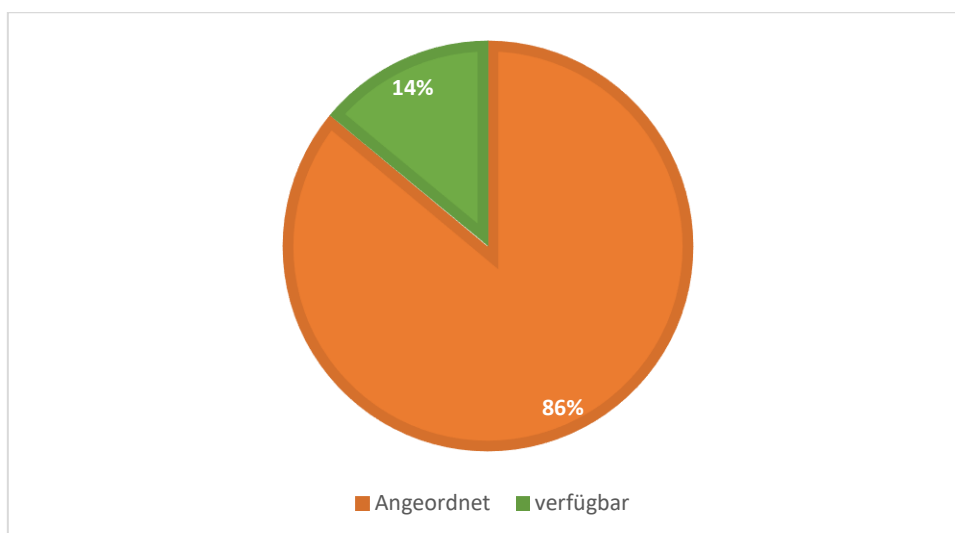

Die Herstellung des Radweganschlusses erfolgt. Die Maßnahme wurde abgenommen und ist somit abgeschlossen.

Straßenbau Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541004201701	1.499.086,22 €	1.180.922,90 €	318.163,32 €

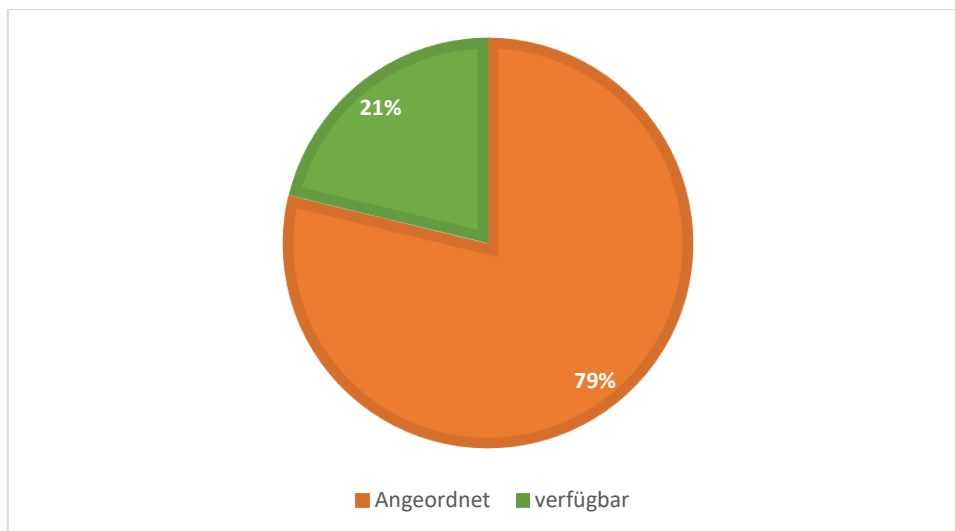

Die Maßnahme ist zu ca. 70 % abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für November 2019 geplant.

beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541004201703	434.678,08 €	31.000,00 €	403.678,08 €

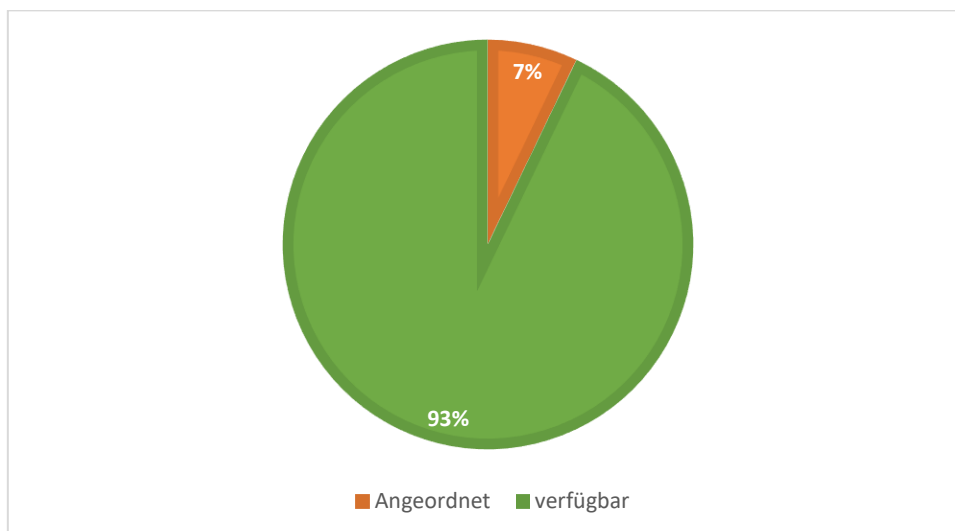

Der Planungsauftrag wurde erteilt. Baubeginn wird voraussichtlich Ende 2020 sein.

Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541009009901	194.426,26 €	107.338,77 €	87.087,49 €

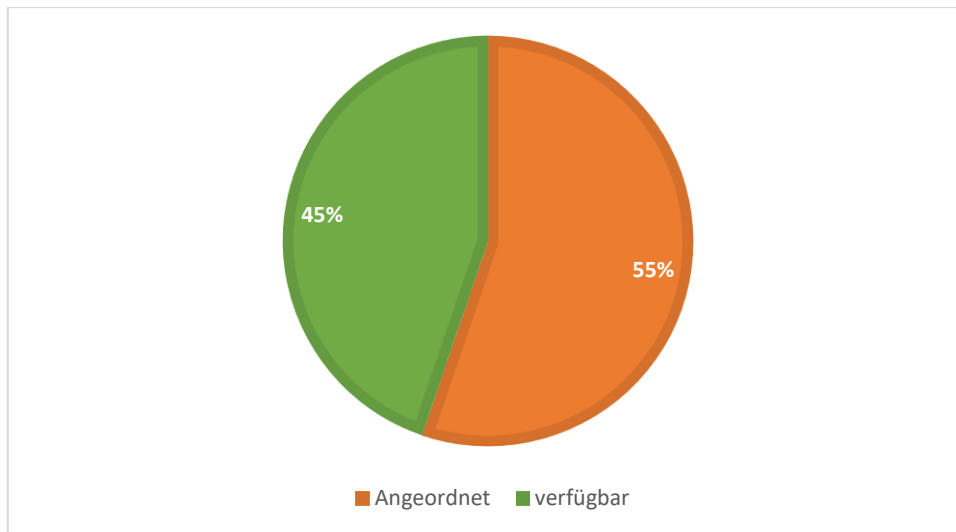

Bisher sind 22 Flurstücke mit einer Flächengröße von 14.053 m² angekauft worden. Dazu sind die notwendigen Teilungsvermessungen und deren Fortschreibungen erfolgt. An weiteren 18 steht die katasteramtliche Fortschreibung noch aus. Die Flurstücke des Infrastrukturvermögens betreffen hauptsächlich Straßenflurstücke im Ortsteil Schildow (Elisabeth- und Viktoriastraße) und Zühlsdorf (Basdorfer Straße).

Errichtung von Fahrgastunterständen


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541009009902	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €

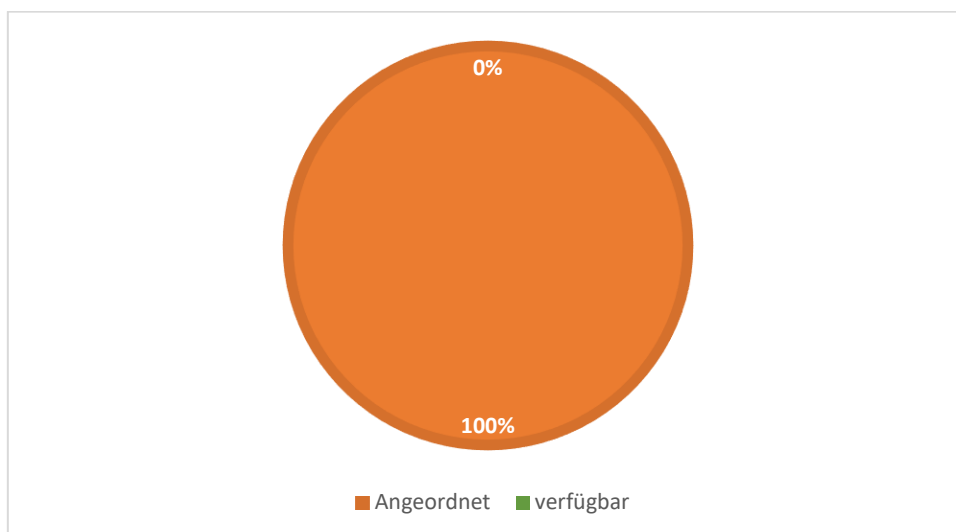

Der Fahrgastunterstand in Zühlsdorf (Am Waldhasen) wurde errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Errichtung von Fahrradüberdachungen


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541009009903	43.205,18 €	41.322,87 €	1.882,31 €

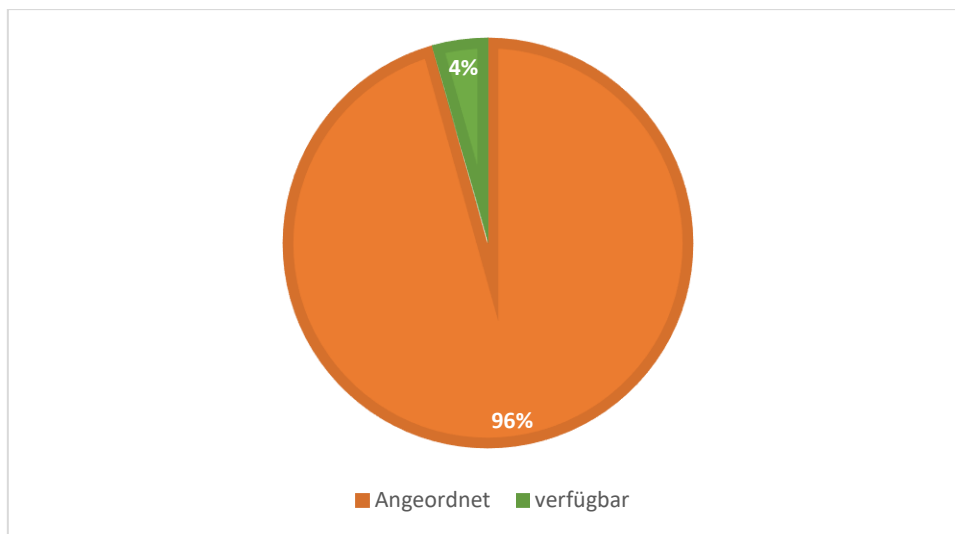

Die Errichtung des Fahrradunterstandes in Zühlsdorf bei der Kita „Schneckenhaus“ ist erfolgt.

Allgemeine Straßenbaumaßnahmen


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541009009904	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €

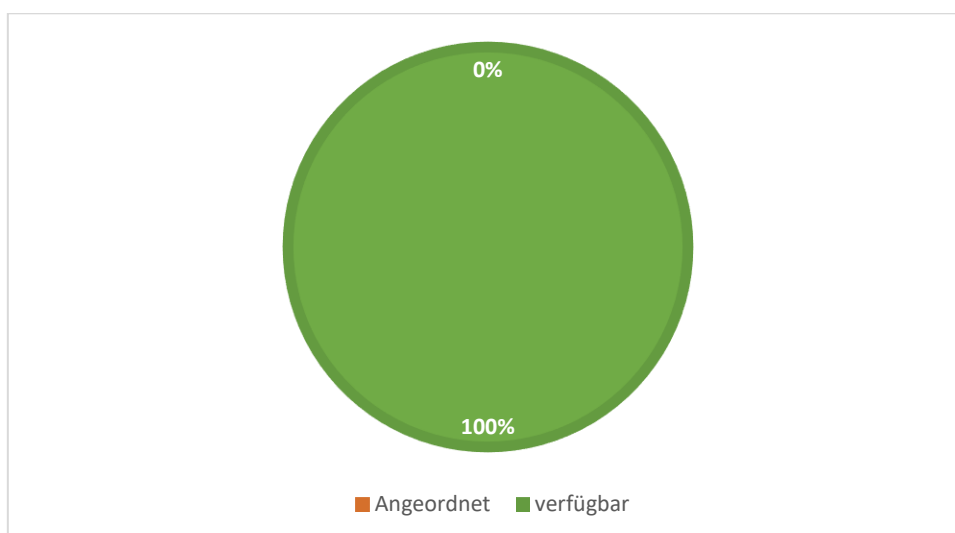

Diese Investition dient zur Fortführung der Prioritätenliste. Derzeit wurde aber noch keine neue Prioritätenliste beschlossen, daher sind die Mittel noch verfügbar.

Ausbau der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541109009901	253.154,25 €	53.154,25 €	200.000,00 €

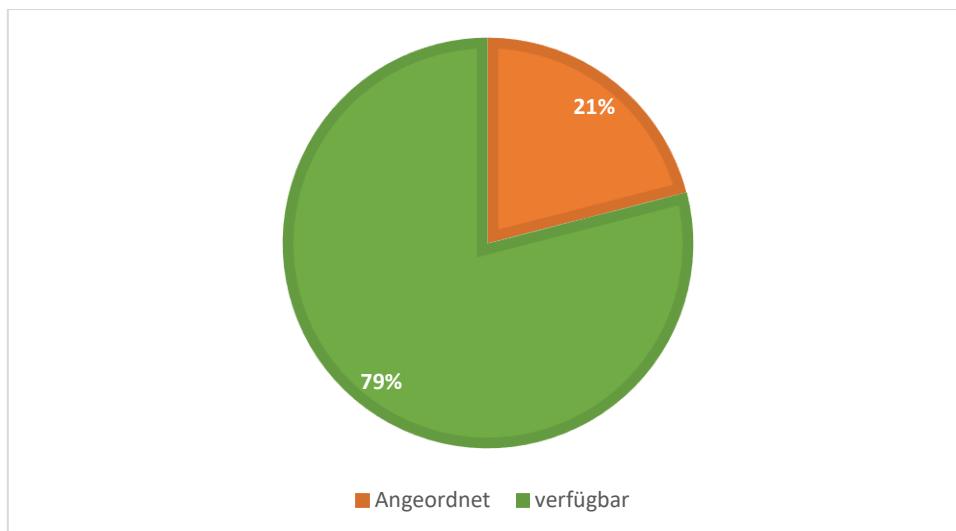

Derzeit wird für die Beleuchtung in der Buchhorster Straße in Mühlenbeck im Zuge der Schulwegsicherung ein Konzept entwickelt.

Straßenbeleuchtung Kirschweg OT Mühlenbeck


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
541102201901	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €

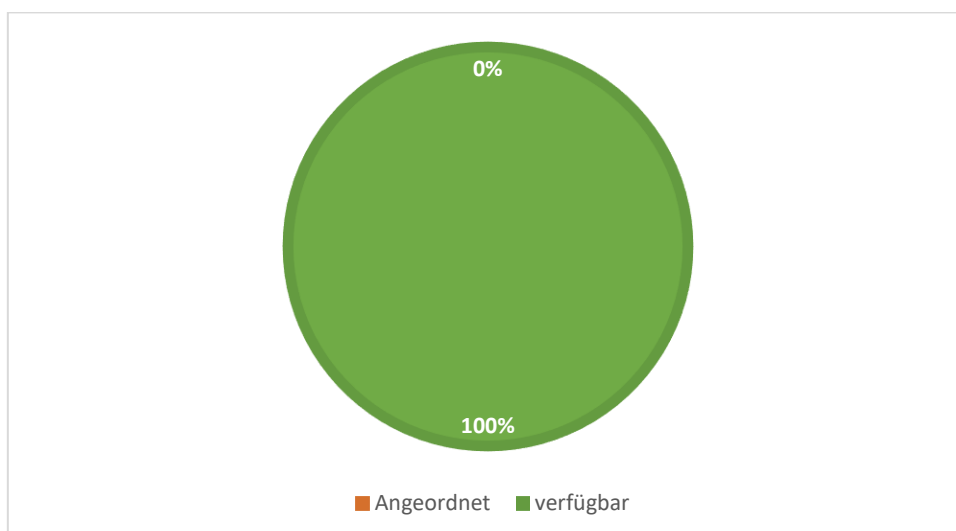

Aufgrund von Leitungsarbeiten im Kirschweg verzögert sich der Bau der Straßenbeleuchtung.

Bau Parkpalette P+R S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
546001201901	200.000,00 €	44.352,24 €	155.647,76 €

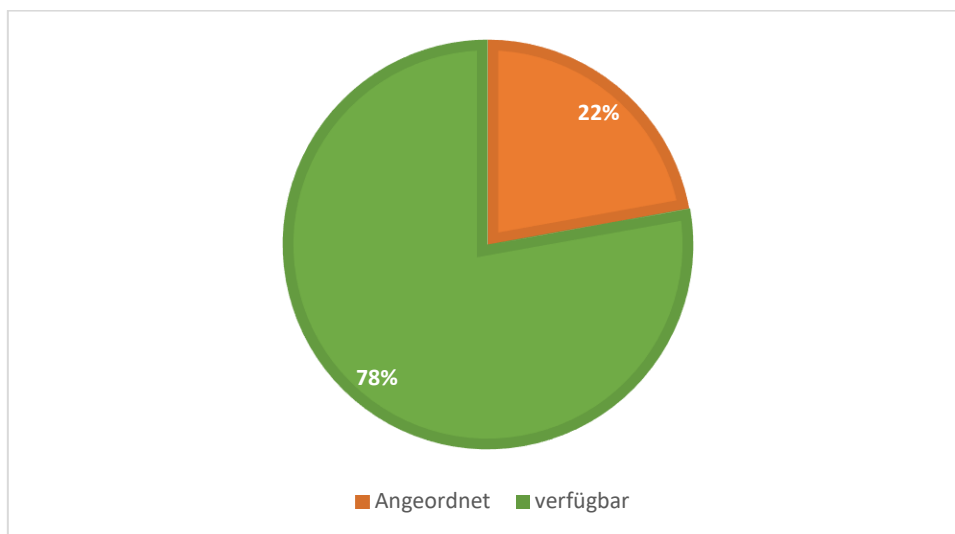

Das B-Plan-Verfahren läuft. Da der Planungsbereich an das Naturschutzgebiet angrenzt wurde durch die untere Naturschutzbehörde eine Nachvermessung gefordert. Diese wurde beauftragt. Mit der Entwurfsplanung werden parallel Fördermittel für diese Maßnahme beantragt.

Parkeinrichtung „Alte Waage“ ggü. Aldi


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
546001201902	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €



Der Auftrag für die Planung des Parkplatzes soll im September 2019 erteilt werden. Der Baubeginn ist für 2020 geplant.

Bau des Parkplatzes Holunderweg


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
546003201901	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €



Der Entwurf des Bebauungsplanes für den Holunderweg in Schönfließ war in der Auslegung. Dabei ist eine Vielzahl von Anregungen und Hinweise eingegangen. Als nächster Schritt wird der Abwägungs- und Satzungsbeschluss durch die Gemeindevertretung erfolgen.

Dorfplatz Schildow


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551002201101	265.800,00 €	38.716,50 €	227.083,50 €

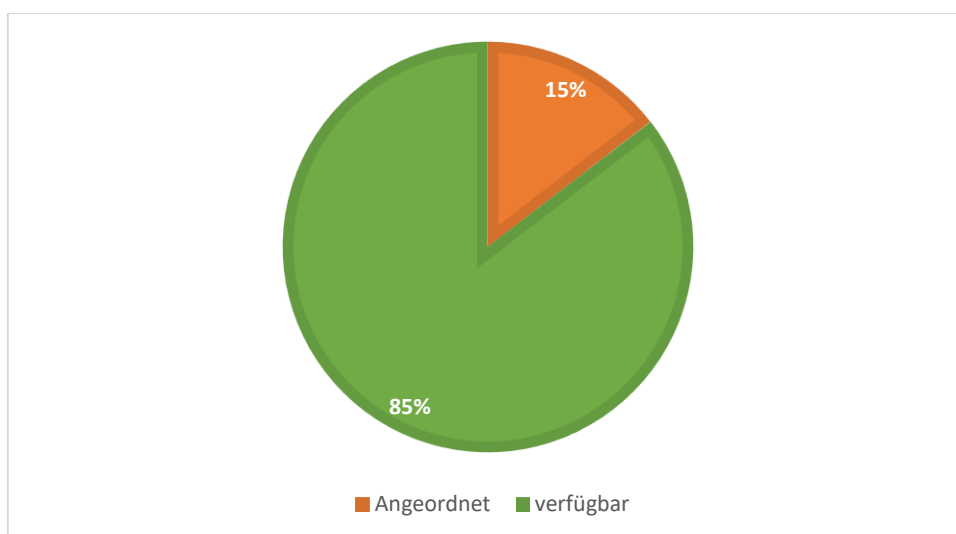

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Wegen einer geplanten Zuwegung hängt der weitere Verlauf vom Bau des Seniorenheimes ab. Für 2020 werden Baukosten eingeplant.

Gestaltung des Angers in Schildow


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551002201901	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €



Es wurde bereits ein Lageplan erstellt. Die Ortsgestaltungsgruppe hat einen Entwurf erarbeitet. Dieser sieht neue Wege und Bepflanzungen vor. Der Planungsauftrag wurde erteilt. In 2020 soll die Bauphase beginnen.

Gutspark Schönfließ


Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551003201601	209.326,70 €	42.952,51 €	166.374,19 €

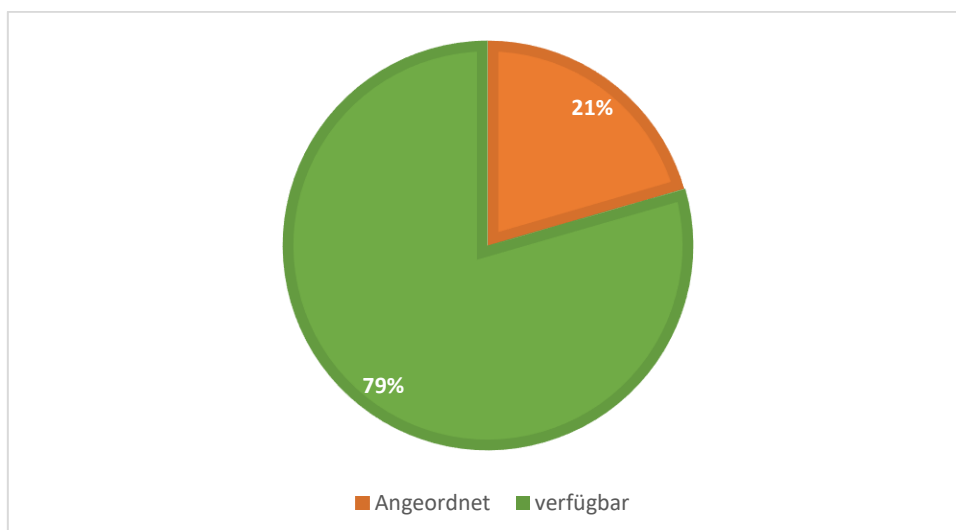

Die Einholung von wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungen dauert noch an. Das weitere Vorgehen hängt von der Erteilung dieser Genehmigungen ab. Als nächster Schritt erfolgt die Ausschreibung für die weiteren Maßnahmen, wie die Herstellung der Verkehrssicherheit.

Ausstattung der Gemeindearbeiter

Investitionsnummer	bisher bereitgestellt	Angeordnet	verfügbar
551009009901	288.740,44 €	226.324,02 €	62.416,42 €

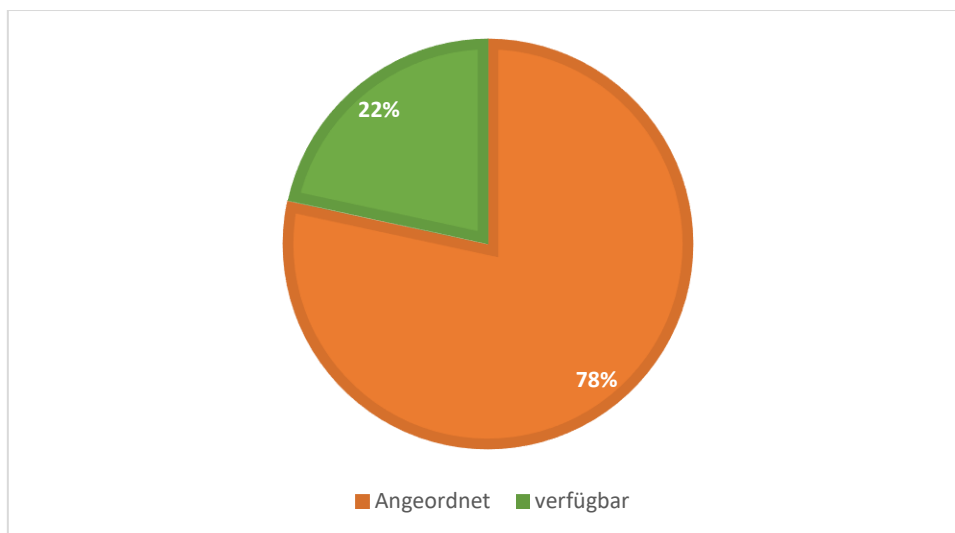

Für die Gemeindearbeiter wurde ein Kleintransporter mit Kipppritsche beschafft. Außerdem erfolgte die Ausstattung mit einem Aufsitzrasenmäher, einem Schweißgerät, einer Akkuheckenschere, einer Sense und einem Blasgerät. Für dieses Jahr ist noch der Kauf von Fahrzeugen vorgesehen.

11100 Allgemeine Verwaltung

Erstellung Flucht- und Rettungspläne (1.300 €)

11130 Gebäudemanagement

Fliesenarbeiten Gemeindehaus Schönfließ (2.300 €)

12600 Brandschutz

Reparatur Toranlage Mühlenbeck (4.800 €)
Schlosserarbeiten Schönfließ (1.200 €)

21111 Grundschule Mühlenbeck

Austausch Gasbrennwertanlage (7.600 €)
Austausch Eingangstür Haus 3 (6.300 €)
Erneuerung und Installation Steigleitung (27.000 €)
Austausch Holzfenster Einfeldhalle (1.800 €)
Erneuerung Bodenbelag (3.000 €)

21121 Grundschule Schildow

Beleuchtung Sportplatz (6.200 €)
Malerarbeiten (2.000 €)
Austausch Fenster (24.000 €)

36511 Kita „Raupe Nimmersatt“

Umbau WC (7.600 €)
Malerarbeiten (6.400 €)

36512 Kita „Koboldhaus“

Akustikarbeiten (18.900 €)
Malerarbeiten (5.000 €)

36521 Kita „Spatzenhaus“

Malerarbeiten (3.000 €)

36523 Hort "Kinderland"

Erneuerung Fenster (8.400 €)

36531 Kita „Am Schlosspark“

Erstellung Flucht- und Rettungspläne (2.800 €)
Akustikverbesserung (61.900 €)
Sanierung Holzfenster (7.100 €)
Malerarbeiten (12.400 €)

36541 Kita „Schneckenhaus“

Akustikverbesserung (30.700 €)

51100 Bauleitplanung

B-Plan Nr. 32 (9.700 €)
FNP und LNP (6.200 €)
Lärmaktionsplan (10.700 €)
